


Информация об оценке эффективности (результативности) использования бюджетных средств на развитие культуры

В период 2019 - 2021 годов в рамках реализации мероприятия ГП «Развития культуры» 265,3 млн рублей (52,3%) направлено на проведение капитального ремонта 20 объектов культуры (17 КДУ, 2 детские школы искусств, 1 театр).

Работы по капитальному КДУ в проверяемом периоде осуществлялись УКС РСО-Алания, подведомственным Минстрою РСО-Алания.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что работы по капитальному ремонту отдельных зданий КДУ приняты УКС РСО – Алания в полном объеме¹, вместе с тем в связи с недоделками отсутствует возможность их функционирования².

Так выездной проверкой функционирования дома культуры с. Ногкау установлено, что работы по «Капитальному ремонту здания ДК с. Ногкау» приняты с недоделками: некачественная заделка окон и коммуникаций, не установлены туалетные кабинки, частично не закреплена сантехника, отвод канализации проложен через улицу (зимнее замерзание и как следствие возможные аварийные ситуации), отделка лестничных маршей (уличных и внутренних) произведена некачественно, асфальт прогибается при ходьбе и прочие нарушения.

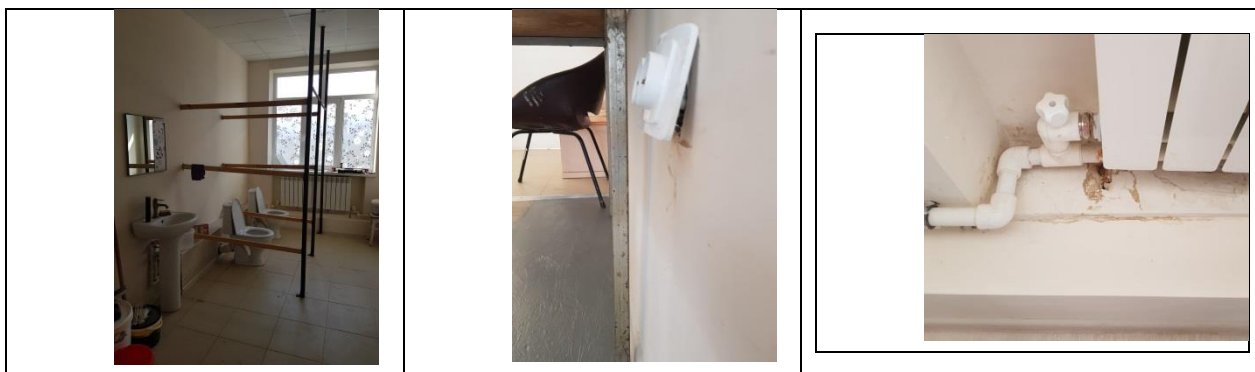


До настоящего времени (с декабря 2020 года), несмотря на неоднократные обращения Управления культуры администрации

¹ Согласно данным Единой информационной системе в сфере закупок.

² По состоянию на 4 ноября 2021 года.

местного самоуправления Алагирского района РСО-Алания в адрес УКС РСО-Алания³, работы по устранению недостатков не устранены.

Аналогичная ситуация сложилась по объекту «Капитальный ремонт дома культуры в с.Суадаг Алагирского района РСО-Алания» со сроком окончания работ 30 августа 2021 года. Работы по капитальному ремонту здания ДК с. Суадаг приняты с недоделками: не установлены лестничные ограждения (частично), дверные наличники не установлены (частично), не установлен пандус, некачественно произведена штукатурка (частично), на отдельных дверях не установлены ручки (в том числе на пожарном выходе), отсутствуют светильники и уличные навесы на пожарных выходах, некачественная заделка коммуникаций и пр., не убран строительный мусор.

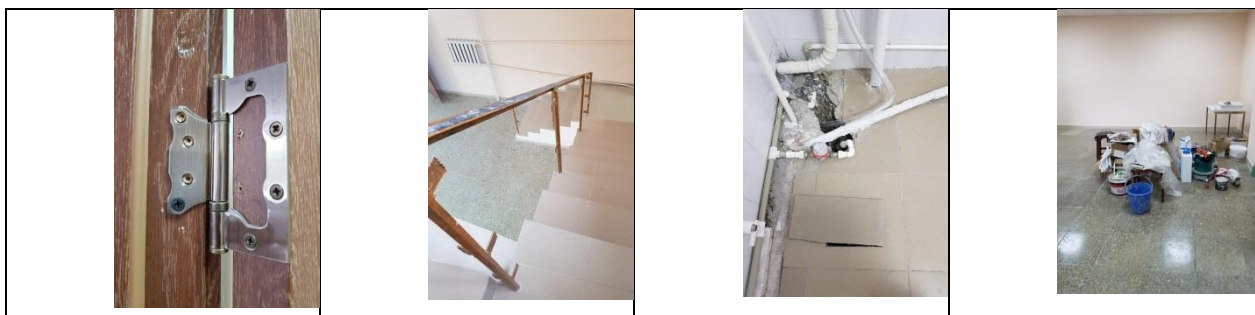

В УКС РСО-Алания дважды⁴ были направлены обращения по вопросам качества выполнения работ.

Таким образом, до настоящего времени (в том числе к началу учебного года) в доме культуры отсутствует возможность проведения мероприятий.

По объекту «Капитальный ремонт дома культуры в с. Ольгинское Правобережного района РСО-Алания» (срок выполнения работ 15 августа 2021 года) по состоянию на 3 декабря 2021 года техническая готовность составляет 83%. Таким образом, также сорваны сроки ввода в эксплуатацию объекта к началу учебного года.

Анализ данных о востребованности учреждений культуры после проведения капитальных ремонтов их зданий, полученных в ходе контрольного мероприятия от районных муниципальных образований, свидетельствует об улучшении качества оказываемых услуг, увеличился охват населения, увеличилось количество клубных формирований, а также их количественный состав, увеличилось количество проводимых

³ Письма от 19 мая 2021 г. и от 1 июня 2021 г. о принятии незамедлительных мер по устранению недостатков выполненных работ и определения окончательных сроков сдачи объекта и ввода его в эксплуатацию

⁴ Письма Управление культуры администрации местного самоуправления Алагирского района РСО-Алания от 1 июня 2021 г. и от 31 августа 2021 г.

мероприятий, а также об отсутствующей ранее возможности принимать гастрольные коллективы.

В рамках реализации Соглашений⁵ на подготовку и проведение на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации (1100-летие Крещения Алании)⁶ государственной программой РСО-Алания «Развитие культуры Республики РСО-Алания на 2014-2024 годы»⁶ предусмотрено мероприятие «Создание свода памятников Севера и Юга Алании-Осетии, *разработка интерактивной карты*»

На всю сумма средств, предусмотренных на эти цели законами о бюджете РСО-Алания на 2020 - 2021 годы⁷, Комитетом по охране памятников РСО-Алания заключено 4 государственных контракта (1,3 млн рублей, в том числе 1,2 млн рублей – за счет средств федерального бюджета). Срок исполнения всех работ – 15 декабря 2021 года.

Данными государственными контрактами предусмотрено выявление и копирование архивных материалов, планов БТИ, разработка графических материалов для формирования свода объектов культурного наследия; фотофиксация объектов культурного наследия с историческим и природным ландшафтами, определение координат объекта культурного наследия на местности, подготовка к изданию и печать тиража книги «Свод памятников истории и культуры Алании-Осетии», а *подготовка материалов для создания интерактивной карты* объектов культурного наследия Осетии-Алании.

Средства на завершение работ по созданию интерактивной карты не предусмотрены.

В ходе проведения контрольного мероприятия Комитетом по охране памятников РСО-Алания заключен договор на безвозмездной основе на выполнение работ по заполнению интерактивной карты с последующим размещением ее на сайте комитета до 31 декабря 2021 года.

По состоянию на 12 января 2021 года на официальном сайте Комитета по охране памятников РСО-Алания интерактивная карта объектов культурного наследия Осетии-Алании отсутствует.

⁵ Соглашения от 14 декабря 2019 г. № 054-09-2020-349 и от 22 декабря 2020 г. № 054-09-2021-311

⁶ Утверждена постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 октября 2021 г. № 388

⁷ от 27 декабря 2019 г. № 86-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; от 24 декабря 2020 г. № 105-РЗ «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
